



最上総合支庁ニュース

2026年3月臨時号



発行元 最上総合支庁総務企画部
総務課 総合案内窓口
電話：0233-29-1360
FAX：0233-23-2605



公式 X



HP

令和6年7月の大雨災害による被害の復旧状況をお知らせします

1 「道路・河川」の復旧状況（令和8年2月末時点）

被災した公共土木施設について、令和8年2月末時点で県管理道路が6割強、河川が2割弱で復旧を完了しております。同年3月末までに、道路の施設すべて、河川で約9割の施設で工事契約を行う見込みです。引き続き、令和8年度末の完全復旧を目指し、全力で工事を進めてまいります。

【県施工分：令和8年2月28日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）	
		面積又は箇所	執行率	面積又は箇所	完成率
公共土木施設					
県管理道路	93 箇所	80 箇所	86 %	57 箇所	61 %
県管理河川・ 砂防	301 箇所	222 箇所	74 %	52 箇所	17 %

2 「農地・農業用施設及び森林関係施設」の復旧状況（令和8年2月末時点）

令和8年2月末時点で、農地・農業用施設は約8割、森林関係施設では約9割で復旧を完了しています。復旧が完了していない箇所については、令和8年度末の工事完成を目指し、市町村等関係機関と協議を進めてまいります。

【県・市町村施工分：令和8年2月28日時点】

区 分	被害面積 又は箇所	契約済み又は執行中		工事完成（復旧完了）		
		面積又は箇所	執行率	面積又は箇所	完成率	
農地・農業用施設						
農 地	622 ha	619 ha	99 %	523 ha	84 %	
農業用施設	1,828 箇所	1,774 箇所	97 %	1,551 箇所	85 %	
森林関係施設						
林地・ 治山施設	25 箇所	25 箇所	100 %	17 箇所	68 %	
林道施設	127 箇所	126 箇所	99 %	126 箇所	99 %	

3 主な工事の進捗状況

国道344号(真室川町差首鍋地内)



大雨で道路が崩れました




大型コンクリートブロックで道路を復旧しました

鳥出川(最上町富澤地内)



大雨で増えた河川の水で河底が削れ、護岸が崩れました

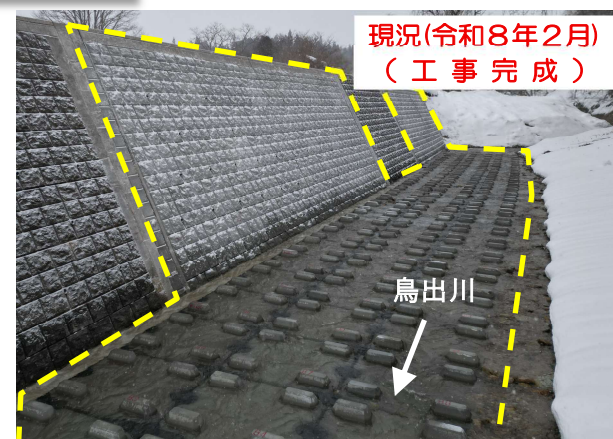

崩れた護岸をコンクリートブロックで復旧しました

最上内川(鮭川村京塚地内)



大雨で河川の水が増え、護岸が崩れました



崩れた護岸をコンクリートブロックで復旧しました

『令和6年豪雨災害 最上地域復旧工事デジタルマップ公開中』

◆災害復旧工事個所の進捗状況（未施工、施工中、施工済）が地図上で確認できます。

道路災害復旧工事箇所マップ ▶▶



○河川災害復旧工事箇所マップ ▶▶

